

Gerência de Projetos

Aula 12

Evandro J.R. Silva

Sumário

- 1 Desenvolvimento Dirigido por Plano
 - Planos de Projeto
 - O Processo de Planejamento
- 2 Definição de Cronograma de Projeto
 - Apresentação do Cronograma
- 3 Atividade

Desenvolvimento Dirigido por Plano

- 1 Desenvolvimento Dirigido por Plano
- 2 Definição de Cronograma de Projeto
- 3 Atividade

Desenvolvimento Dirigido por Plano

- É uma abordagem “tradicional” para a Engenharia de Software na qual o processo de desenvolvimento é planejado em detalhes.
- É uma ferramenta para os gerentes como apoio na tomada de decisões, e também como uma maneira de medir o progresso.

Planos de Projeto

1 Desenvolvimento Dirigido por Plano

■ Planos de Projeto

■ O Processo de Planejamento

2 Definição de Cronograma de Projeto

3 Atividade

Planos de Projeto

- Um plano de projeto estabelece os **recursos disponíveis** para o projeto, a **divisão de trabalho** e um **cronograma** para executar o trabalho.
- Também, o plano deve **identificar** a **abordagem** adotada para o **gerenciamento de risco**, bem como os **riscos para o projeto** e o **software** em desenvolvimento.

Planos de Projeto

- Os planos costumam incluir as seguintes seções:

- 1 Introdução

- 2 Organização do projeto

- 3 Análise de risco

- 4 Requisitos de recursos de hardware e software

- 5 Divisão de trabalho.

- 6 Cronograma de projeto.

- 7 Mecanismos de monitoramento e de divulgação.

Planos de Projeto

- Os planos costumam incluir as seguintes seções:

- 1 **Introdução**

- **Descreve** resumidamente os **objetivos** do projeto e **estabelece** as **restrições** (por exemplo, orçamento e tempo) que afetam o gerenciamento do projeto.

- 2 Organização do projeto

- 3 Análise de risco

- 4 Requisitos de recursos de hardware e software

- 5 Divisão de trabalho.

- 6 Cronograma de projeto.

- 7 Mecanismos de monitoramento e de divulgação.

Planos de Projeto

- Os planos costumam incluir as seguintes seções:

- 1 Introdução

- 2 Organização do projeto

- **Descreve** a maneira como o time de desenvolvimento é organizado, **as pessoas envolvidas e seus papéis no time.**

- 3 Análise de risco

- 4 Requisitos de recursos de hardware e software

- 5 Divisão de trabalho.

- 6 Cronograma de projeto.

- 7 Mecanismos de monitoramento e de divulgação.

Planos de Projeto

- Os planos costumam incluir as seguintes seções:

- 1 Introdução

- 2 Organização do projeto

- 3 Análise de risco

- 4 Requisitos de recursos de hardware e software

- **Especifica o hardware e o software** de apoio **necessários** para realizar o desenvolvimento. Se houver necessidade de adquirir hardware, as estimativas de preço e de cronograma de entrega podem ser incluídas.

- 5 Divisão de trabalho.

- 6 Cronograma de projeto.

- 7 Mecanismos de monitoramento e de divulgação.

Planos de Projeto

■ Os planos costumam incluir as seguintes seções:

- 1 Introdução
- 2 Organização do projeto
- 3 Análise de risco
- 4 Requisitos de recursos de hardware e software
- 5 **Divisão de trabalho**
 - **Estabelece a divisão do projeto em atividades e identifica as entradas e as saídas de cada atividade de projeto.**
- 6 Cronograma de projeto
- 7 Mecanismos de monitoramento e de divulgação

Planos de Projeto

■ Os planos costumam incluir as seguintes seções:

1 Introdução

2 Organização do projeto

3 Análise de risco

4 Requisitos de recursos de hardware e software

5 Divisão de trabalho

6 Cronograma de projeto

- **Mostra as dependências entre as atividades, o tempo estimado necessário para alcançar cada marco e a alocação de pessoas às atividades.**

7 Mecanismos de monitoramento e de divulgação

Planos de Projeto

■ Os planos costumam incluir as seguintes seções:

- 1 Introdução
- 2 Organização do projeto
- 3 Análise de risco
- 4 Requisitos de recursos de hardware e software
- 5 Divisão de trabalho

- 6 Cronograma de projeto

- 7 **Mecanismos de monitoramento e de divulgação**
 - **Define os relatórios de gestão que devem ser produzidos, quando devem ser produzidos e os mecanismos de monitoramento de projeto a serem utilizados.**

Planos de Projeto

- Também é possível desenvolver uma série de planos suplementares.

Plano	Descrição
Plano de gerenciamento de configuração	Descreve os procedimentos de gerenciamento de configuração e as estruturas a serem utilizadas.
Plano de implantação	Descreve como o software e o hardware associado (se necessário) serão implantados no ambiente do cliente. Esse plano deve incluir um plano para migrar os dados dos sistemas existentes.
Plano de manutenção	Prevê os requisitos, os custos e o esforço de manutenção.
Plano de qualidade	Descreve os procedimentos e os padrões de qualidade que serão utilizados no projeto.
Plano de validação	Descreve as abordagens, os recursos e o cronograma utilizados na validação do sistema.

O Processo de Planejamento

1 Desenvolvimento Dirigido por Plano

- Planos de Projeto

- O Processo de Planejamento


2 Definição de Cronograma de Projeto

3 Atividade

O Processo de Planejamento

- O planejamento de projeto é um **processo iterativo** que **começa** na **criação de um plano de projeto inicial** durante a fase inicial do projeto.
- À medida que **mais informações** sobre o sistema e o time de projeto **são disponibilizadas**, é necessário **revisar o plano** regularmente para refletir as alterações.


O Processo de Planejamento

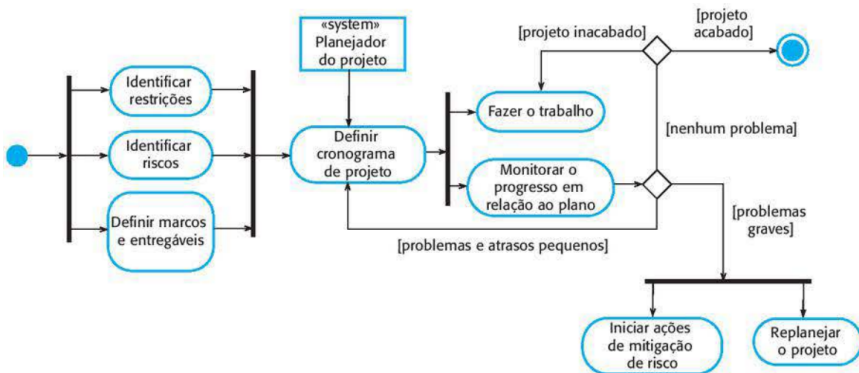



Definição de Cronograma de Projeto

- 1 Desenvolvimento Dirigido por Plano
- 2 Definição de Cronograma de Projeto**
- 3 Atividade

Definição de Cronograma de Projeto

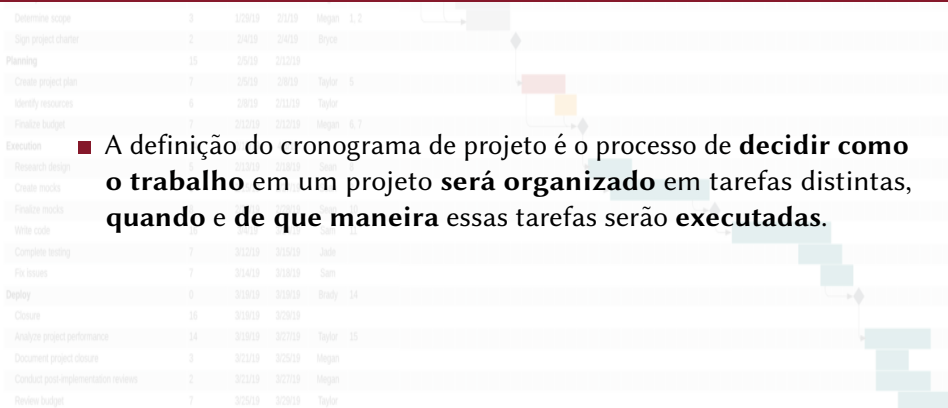


Definição de Cronograma de Projeto

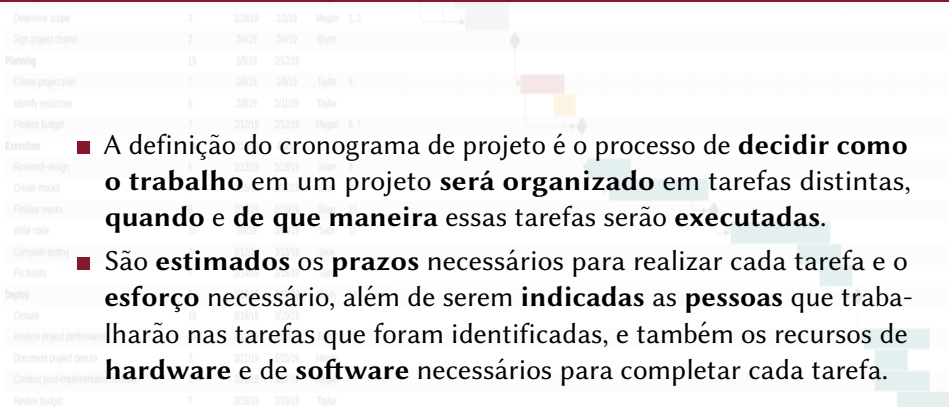

Definição de Cronograma de Projeto

Determine scope	3	1/28/19	2/1/19	Megan	1, 2
Sign project charter	2	2/4/19	2/4/19	Bryce	
Planning	15	2/5/19	2/12/19		
Create project plan	5	2/5/19	2/12/19		
Identify resources	4	2/8/19	2/11/19	Taylor	
Finalize budget	7	2/12/19	2/12/19	Megan	6, 7
Execution	14	2/13/19	4/3/19		
Research design	5	2/13/19	2/18/19	Sean	8
Create mocks	6	2/15/19	2/27/19	Sean	9
Finalize mocks	8	2/28/19	2/28/19	Sean	10
Write code	18	3/4/19	3/14/19	Sam	11
Complete testing	7	3/12/19	3/15/19	Jadi	
Fix issues	7	3/14/19	3/18/19	Sam	
Deploy	8	3/18/19	3/19/19	Brady	14
Closure	18	3/19/19	3/29/19		
Analyze project performance	14	3/19/19	3/27/19	Taylor	15
Document project closure	3	3/21/19	3/25/19	Megan	
Conduct post-implementation reviews	2	3/21/19	3/27/19	Megan	
Review budget	7	3/25/19	3/29/19	Taylor	

■ E se algo der errado?

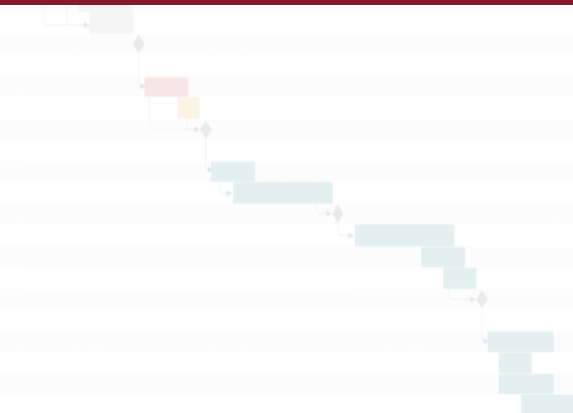

Definição de Cronograma de Projeto

■ E se algo der errado?

■ Uma boa regra geral é estimar como se nada desse errado e, em seguida, aumentar a estimativa para cobrir os problemas previstos e, se possível aumentar também para imprevistos.



Apresentação do Cronograma


1 Desenvolvimento Dirigido por Plano

2 Definição de Cronograma de Projeto

■ Apresentação do Cronograma

3 Atividade

Apresentação do Cronograma

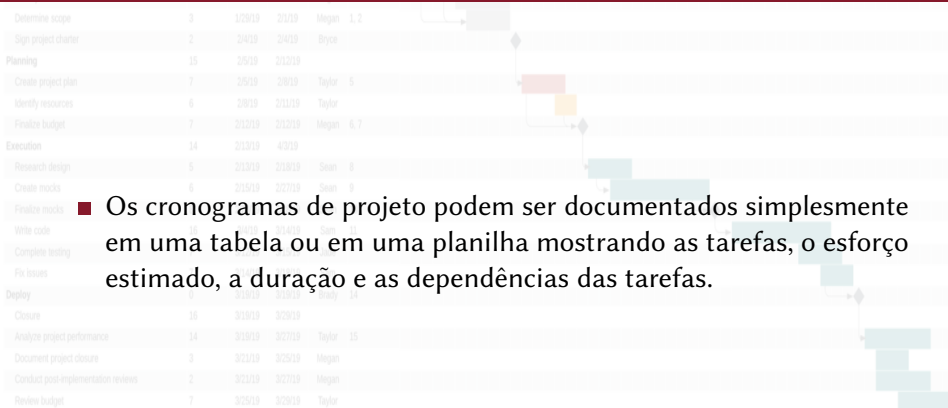

Legend



Apresentação do Cronograma

Determine scope	3	10/9/19	21/1/19	Megan	1.2	
Sign project						
Planning	Tarefa	Esforço (pessoas-dia)	Duração (dias)	Dependências		
Create project charter	T1	15	10			
Identify risks	T2	8	15			
Finalize budget	T3	20	15	T1 (M1)		
Execution	T4	5	10			
Research	T5	5	10	T2, T4 (M3)		
Create milestones	T6	10	5	T1, T2 (M4)		
Finalize milestones	T7	25	20	T1 (M1)		
Write code	T8	75	25	T4 (M2)		
Complete	T9	10	15	T3, T6 (M5)		
Fix issues	T10	20	15	T7, T8 (M6)		
Deploy	T11	10	10	T9 (M7)		
Closure	T12	20	10	T10, T11 (M8)		
Analyze project						
Document						
Conduct project						
Review						


Apresentação do Cronograma

Determine scope	3	1/28/19	2/1/19	Megan	1, 2
Sign project charter	2	2/4/19	2/4/19	Bryce	
Planning	15	2/5/19	2/12/19		
Create project plan	7	2/5/19	2/8/19	Taylor	5
Identify resources	6	2/8/19	2/11/19	Taylor	
Finalize budget	7	2/12/19	2/19/19	Megan	6, 7
Execution	14	3/1/19	3/15/19		
Research design	10	3/1/19	3/11/19		
Create mockups	4	3/11/19	3/15/19		
Finalize mockups	8	3/28/19	2/28/19	Sean	10
Write code	5	3/15/19	3/18/19		
Complete testing	7	3/12/19	3/19/19	Jacob	
Fix issues	1	3/19/19	3/19/19		
Deploy	8	3/18/19	3/18/19	Trudy	14
Closure	1	3/18/19	3/28/19		
Analyze project performance	14	3/18/19	3/27/19	Taylor	15
Document project	1	3/21/19	3/27/19		
Conduct post-implementation reviews	2	3/21/19	3/27/19	Megan	
Review budget	7	3/25/19	3/28/19	Taylor	


- Esse estilo de apresentação dificulta a visualização das relações e das dependências entre as diferentes atividades.
- Por essa razão, foram desenvolvidas visualizações gráficas alternativas dos cronogramas de projeto, que são mais fáceis de ler e de entender.
- Ex.: Diagrama/Gráfico de Gantt.



Apresentação do Cronograma

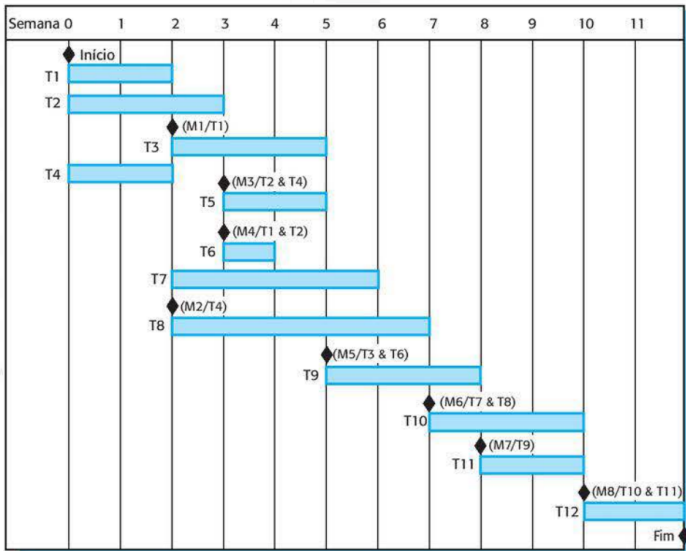

Apresentação do Cronograma

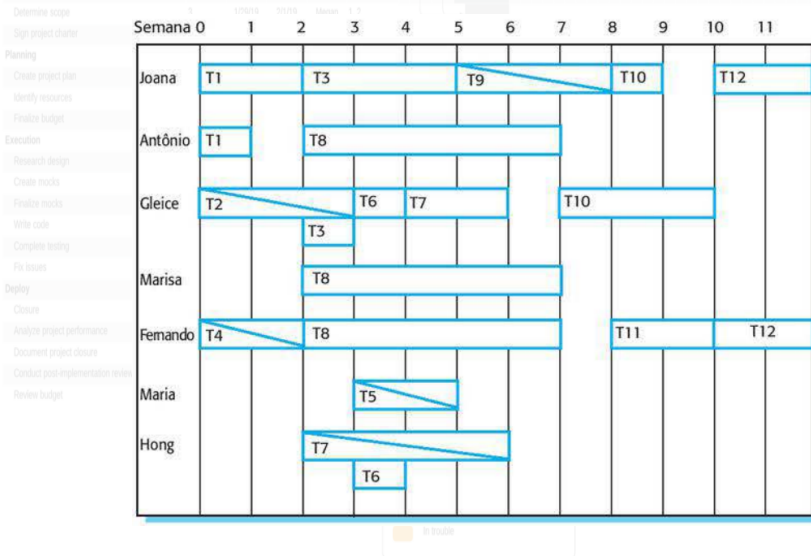

Atividade

- 1 Desenvolvimento Dirigido por Plano
- 2 Definição de Cronograma de Projeto
- 3 Atividade**

Atividade

- Reunir-se em grupo para iniciar o planejamento do aplicativo que tiverem escolhido.
- Criar o planejamento inicial e esboçar um cronograma.
- Aplicativo recomendado: Clickup.
- Alternativas com versões gratuitas:
 - [Top ClickUp Alternatives for 2025: Best Project Management Tools.](#)
 - [13 ClickUp Alternatives Worth Checking Out in 2025.](#)

FIM
