Gerência de Projetos

Aula 04

Evandro J.R. Silva

Sumário

1 Desenvolvimento Dirigido por Plano
- Planos de Projeto
- O Processo de Planejamento

2 Definição de Cronograma de Projeto
- Apresentação do Cronograma

3 Atividade

Desenvolvimento Dirigido por Plano

1 Desenvolvimento Dirigido por Plano

2 Definição de Cronograma de Projeto

3 Atividade

Desenvolvimento Dirigido por Plano

- É uma abordagem “tradicional” para a Engenharia de Software na qual o processo de desenvolvimento é planejado em detalhes.
- É uma ferramenta para os gerentes como apoio na tomada de decisões, e também como uma maneira de medir o progresso.

Planos de Projeto

1 Desenvolvimento Dirigido por Plano
- Planos de Projeto
- O Processo de Planejamento

2 Definição de Cronograma de Projeto

3 Atividade

Planos de Projeto

- Um plano de projeto estabelece os **recursos disponíveis** para o projeto. a **divisão de trabalho** e um **cronograma** para executar o trabalho.
- Também, o plano deve **identificar** a **abordagem** adotada para o **gerenciamento de risco**, bem como os **riscos para o projeto** e o **software** em desenvolvimento.

Planos de Projeto

- Os planos costumam incluir as seguintes seções:
  1. Introdução
  2. Organização do projeto
  3. Análise de risco
  4. Requisitos de recursos de hardware e software
  5. Divisão de trabalho.
  6. Cronograma de projeto.
  7. Mecanismos de monitoramento e de divulgação.

Planos de Projeto

- Os planos costumam incluir as seguintes seções:
  1. Introdução
     - **Descreve** resumidamente os **objetivos** do projeto e **estabelece** as **restrições** (por exemplo, orçamento e tempo) que afetam o gerenciamento do projeto.
  2. Organização do projeto
  3. Análise de risco
  4. Requisitos de recursos de hardware e software
  5. Divisão de trabalho.
  6. Cronograma de projeto.
  7. Mecanismos de monitoramento e de divulgação.

Planos de Projeto

- Os planos costumam incluir as seguintes seções:
  1. Introdução
  2. Organização do projeto
     - **Descreve** a maneira como o time de desenvolvimento é organizado, **as pessoas envolvidas** e **seus papéis no time**.
  3. Análise de risco
  4. Requisitos de recursos de hardware e software
  5. Divisão de trabalho.
  6. Cronograma de projeto.
  7. Mecanismos de monitoramento e de divulgação.

Planos de Projeto

- Os planos costumam incluir as seguintes seções:
  1. Introdução
  2. Organização do projeto
  3. Análise de risco
  4. Requisitos de recursos de hardware e software
     - **Especifica** o **hardware** e o **software** de apoio **necessários** para realizar o desenvolvimento. Se houver necessidade de adquirir hardware, as estimativas de preço e de cronograma de entrega podem ser incluídas.
  5. Divisão de trabalho.
  6. Cronograma de projeto.
  7. Mecanismos de monitoramento e de divulgação.

Planos de Projeto

- Os planos costumam incluir as seguintes seções:
  1. Introdução
  2. Organização do projeto
  3. Análise de risco
  4. Requisitos de recursos de hardware e software
  5. Divisão de trabalho
     - **Estabelece a divisão** do projeto **em atividades** e **identifica** as **entradas** e as **saídas de cada atividade** de projeto.
  6. Cronograma de projeto
  7. Mecanismos de monitoramento e de divulgação

Planos de Projeto

- Os planos costumam incluir as seguintes seções:
  1. Introdução
  2. Organização do projeto
  3. Análise de risco
  4. Requisitos de recursos de hardware e software
  5. Divisão de trabalho
  6. Cronograma de projeto
     - **Mostra** as **dependências entre as atividades**, o **tempo** estimado necessário **para alcançar cada marco** e a **alocação de pessoas** às atividades.
  7. Mecanismos de monitoramento e de divulgação

Planos de Projeto

- Os planos costumam incluir as seguintes seções:
  1. Introdução
  2. Organização do projeto
  3. Análise de risco
  4. Requisitos de recursos de hardware e software
  5. Divisão de trabalho
  6. Cronograma de projeto
  7. Mecanismos de monitoramento e de divulgação
     - **Define** os **relatórios** de gestão **que devem ser produzidos**, **quando** devem ser produzidos e os **mecanismos de monitoramento** de projeto a serem utilizados.

Planos de Projeto

- Também é possível desenvolver uma série de planos suplementares.

Plano	Descrição
Plano de gerenciamento de configuração	Descreve os procedimentos de gerenciamento de configuração e as estruturas a serem utilizadas.
Plano de implantação	Descreve como o software e o hardware associado (se necessário) serão implantados no ambiente do cliente. Esse plano deve incluir um plano para migrar os dados dos sistemas existentes.
Plano de manutenção	Prevê os requisitos, os custos e o esforço de manutenção.
Plano de qualidade	Descreve os procedimentos e os padrões de qualidade que serão utilizados no projeto.
Plano de validação	Descreve as abordagens, os recursos e o cronograma utilizados na validação do sistema.

O Processo de Planejamento

1 Desenvolvimento Dirigido por Plano
- Planos de Projeto
- O Processo de Planejamento

2 Definição de Cronograma de Projeto

3 Atividade

O Processo de Planejamento

- O planejamento de projeto é um **processo iterativo** que **começa** na **criação de um plano de projeto inicial** durante a fase inicial do projeto.
- À medida que **mais informações** sobre o sistema e o time de projeto **são disponibilizadas**, é necessário **revisar o plano** regularmente para refletir as alterações.

O Processo de Planejamento

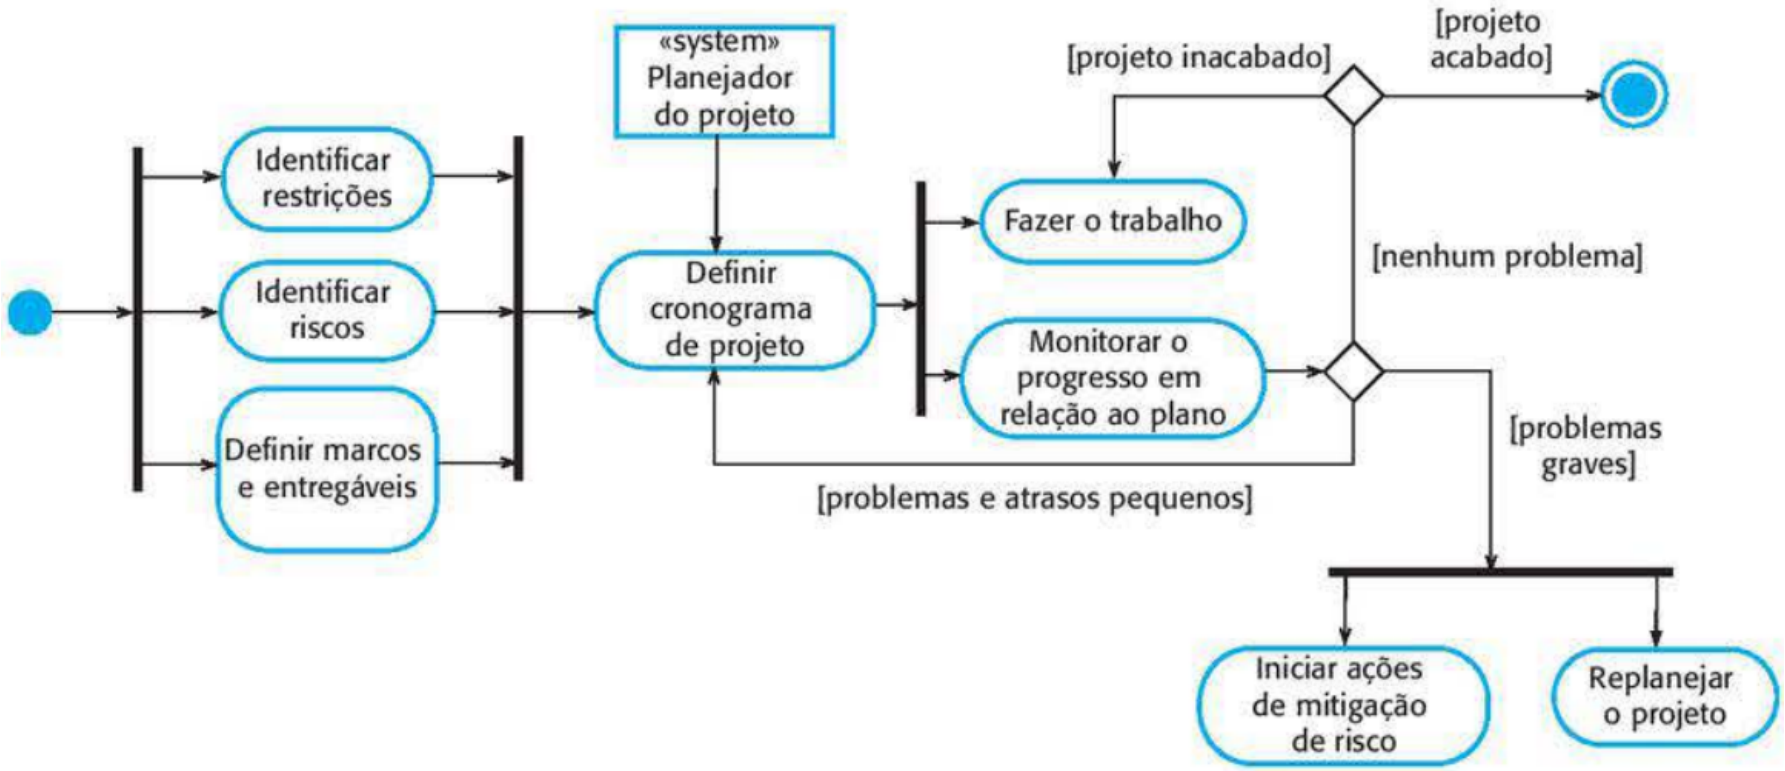

Definição de Cronograma de Projeto

1 Desenvolvimento Dirigido por Plano

2 Definição de Cronograma de Projeto

3 Atividade

Definição de Cronograma de Projeto

- A definição do cronograma de projeto é o processo de **decidir como o trabalho** em um projeto **será organizado** em tarefas distintas, **quando** e **de que maneira** essas tarefas serão **executadas**.

Definição de Cronograma de Projeto

- A definição do cronograma de projeto é o processo de **decidir como o trabalho** em um projeto **será organizado** em tarefas distintas, **quando** e **de que maneira** essas tarefas serão **executadas**.
- São **estimados** os **prazos** necessários para realizar cada tarefa e o **esforço** necessário, além de serem **indicadas** as **pessoas** que trabalharão nas tarefas que foram identificadas, e também os recursos de **hardware** e de **software** necessários para completar cada tarefa.

Definição de Cronograma de Projeto

- E se algo der errado?

Definição de Cronograma de Projeto

- E se algo der errado?
- Uma boa regra geral é estimar como se nada desse errado e, em seguida, aumentar a estimativa para cobrir os problemas previstos e, se possível aumentar também para imprevistos.

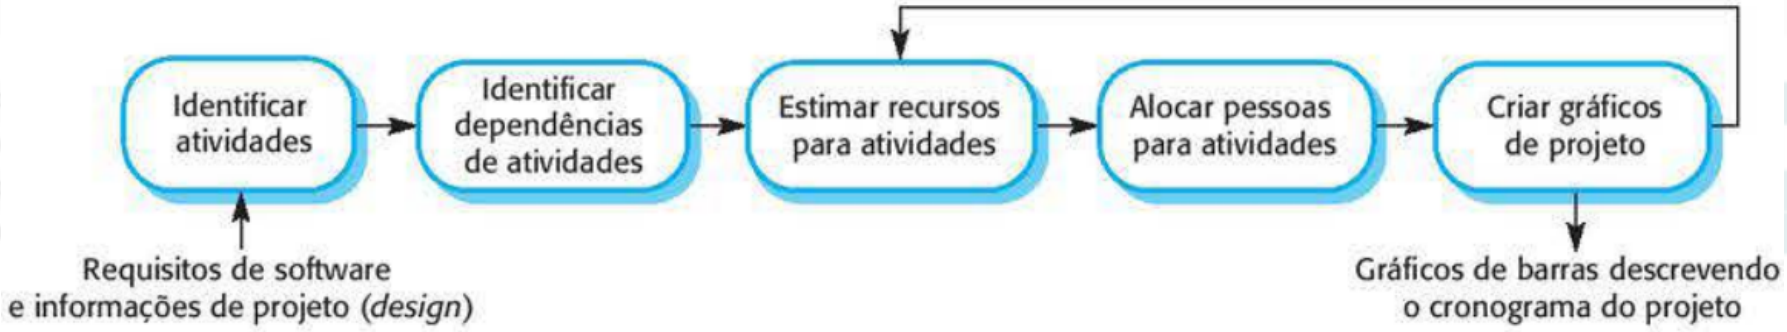

Apresentação do Cronograma

1 Desenvolvimento Dirigido por Plano

2 Definição de Cronograma de Projeto
- Apresentação do Cronograma

3 Atividade

Apresentação do Cronograma

- Os cronogramas de projeto podem ser documentados simplesmente em uma tabela ou em uma planilha mostrando as tarefas, o esforço estimado, a duração e as dependências das tarefas.

Apresentação do Cronograma

Tarefa	Esforço (pessoas-dia)	Duração (dias)	Dependências
T1	15	10	
T2	8	15	
T3	20	15	T1 (M1)
T4	5	10	
T5	5	10	T2, T4 (M3)
T6	10	5	T1, T2 (M4)
T7	25	20	T1 (M1)
T8	75	25	T4 (M2)
T9	10	15	T3, T6 (M5)
T10	20	15	T7, T8 (M6)
T11	10	10	T9 (M7)
T12	20	10	T10, T11 (M8)

Apresentação do Cronograma

- Esse estilo de apresentação dificulta a visualização das relações e das dependências entre as diferentes atividades.
- Por essa razão, foram desenvolvidas visualizações gráficas alternativas dos cronogramas de projeto, que são mais fáceis de ler e de entender.
- Ex.: Diagrama/Gráfico de Gantt.

Apresentação do Cronograma

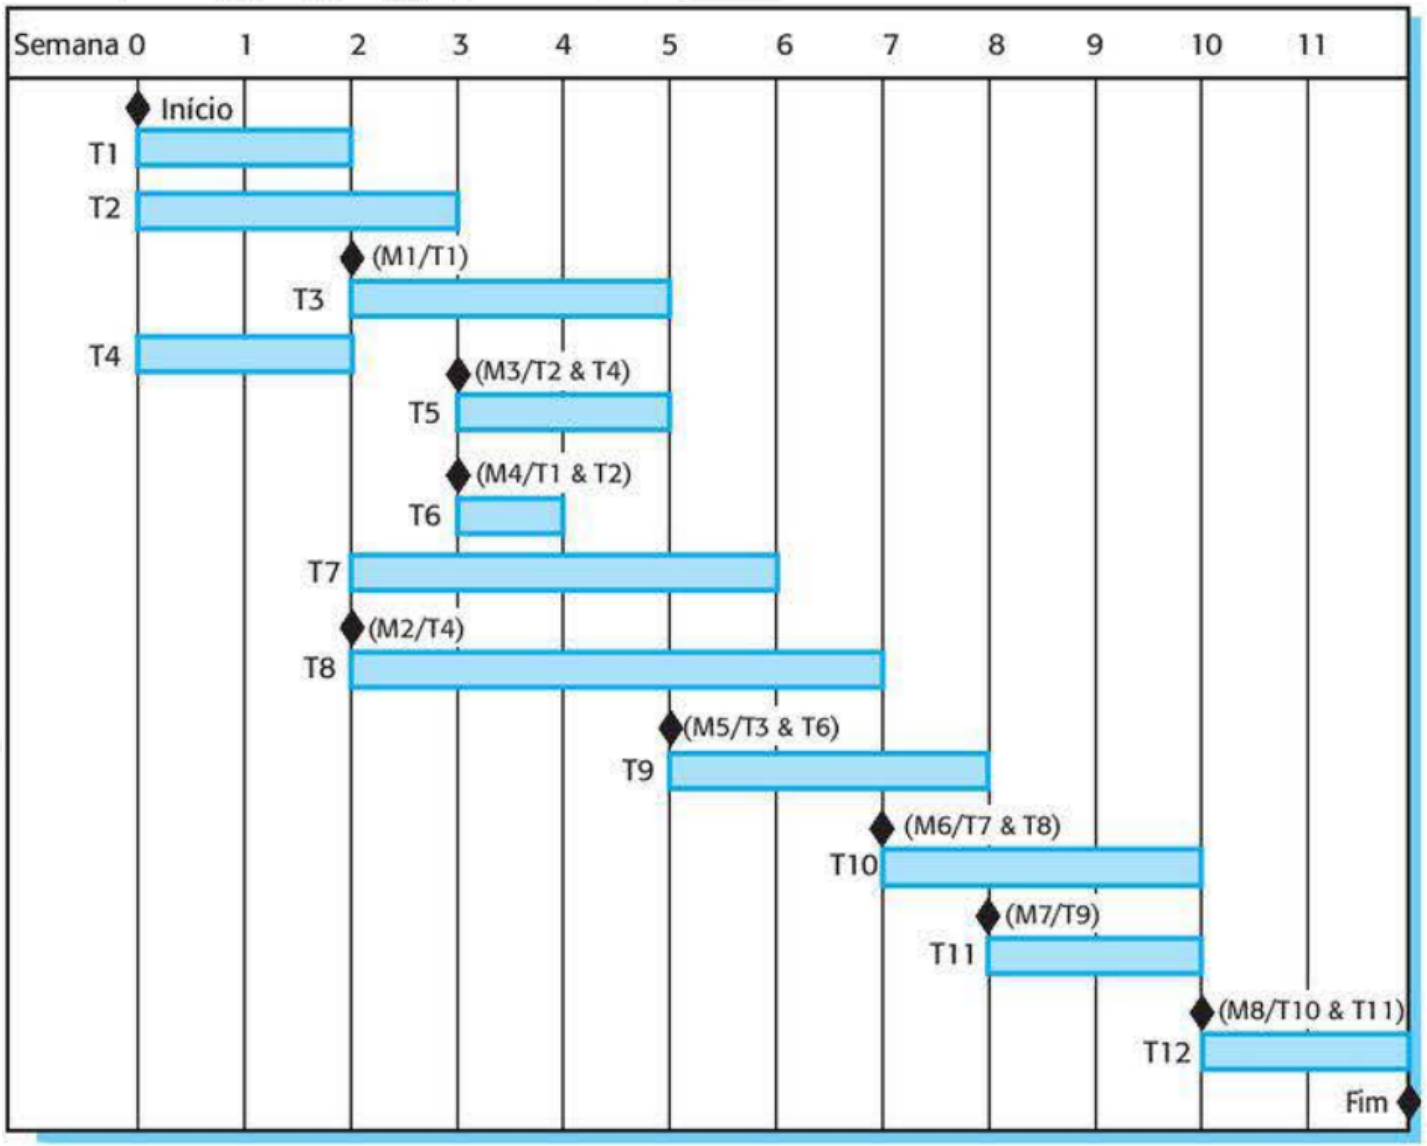

Apresentação do Cronograma

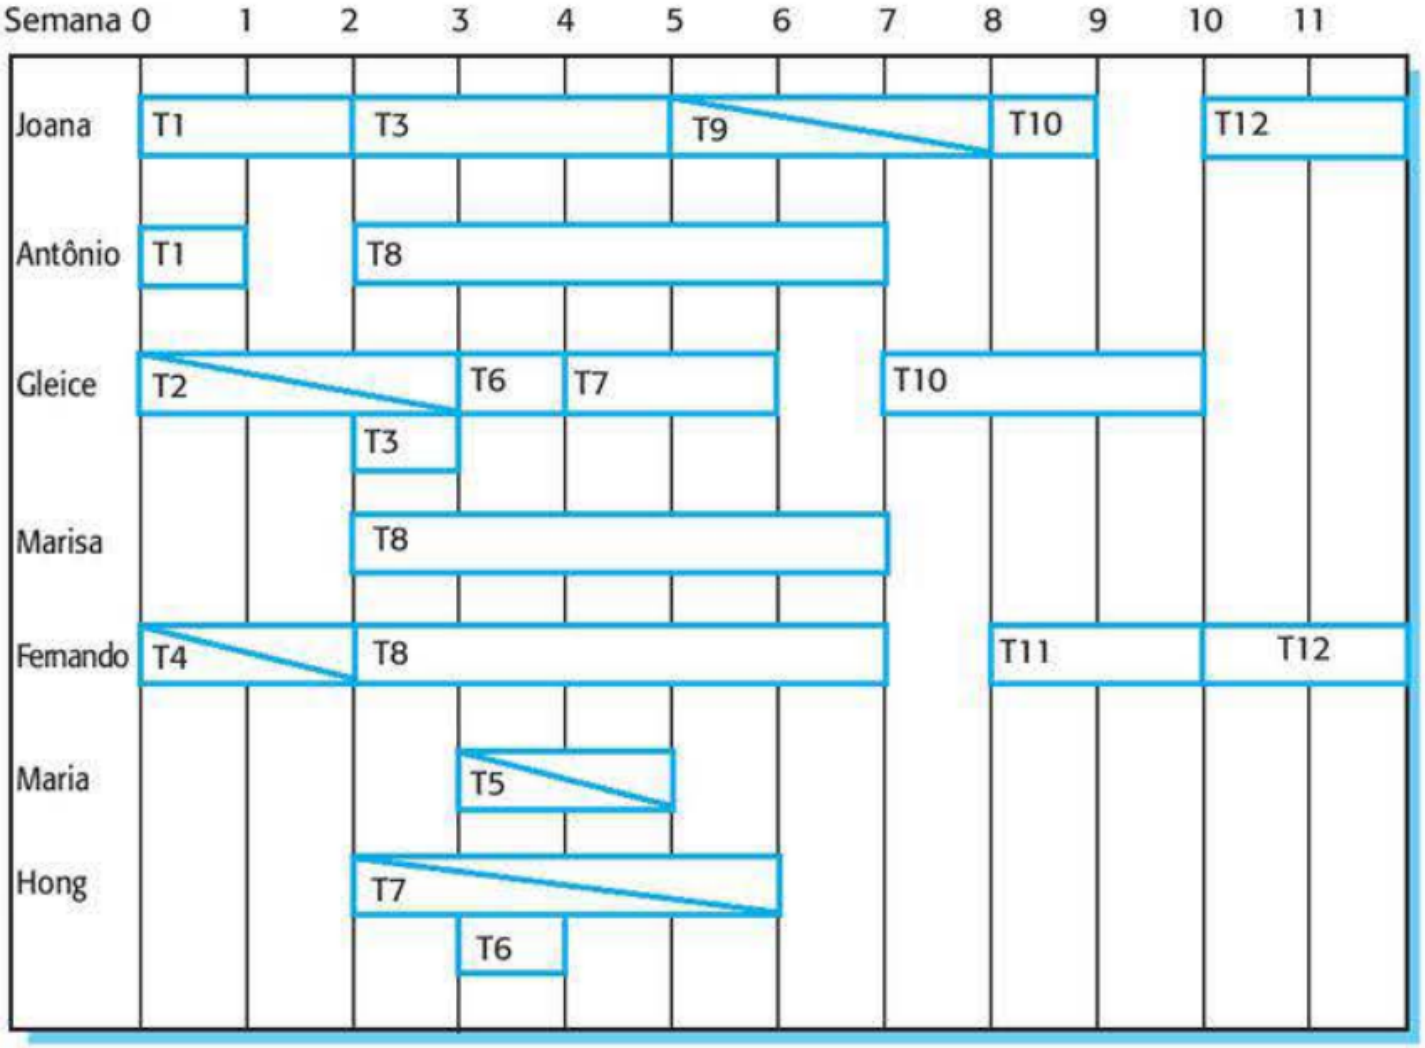

Atividade

1 Desenvolvimento Dirigido por Plano

2 Definição de Cronograma de Projeto

3 Atividade

Atividade

- Reunir-se em grupo para iniciar o planejamento do aplicativo que tiverem escolhido.
- Criar o planejamento inicial e esboçar um cronograma.
- Aplicativo recomendado: Clickup.
- Alternativas com versões gratuitas:
  - Top ClickUp Alternatives for 2025: Best Project Management Tools.
  - 13 ClickUp Alternatives Worth Checking Out in 2025.

FIM
